

広域中間処理施設整備に係る協議・検討状況について

1 これまでの候補地選定経過（令和6年12月候補地白紙撤回後）

令和7年1月10日 斜網地区廃棄物処理広域化推進協議会市長町長会議
1月末を期限とし、公有地（14,000㎡以上）を報告することとなった。

令和7年1月末 施設建設地に必要な大空町内の14,000㎡の町有地（6箇所）について報告。

	場 所	地 番
①	町雪捨て場	女満別東2条6丁目15番の1 他
②	旧女満別中学校用地	女満別眺湖台3丁目63番地の1 他
③	北海道農業共済組合横	女満別昭和146番地の3 他
④	山下岬付近	女満別湖南255番地の1 他
⑤	レンタカー駐車場	女満別中央260番地の1
⑥	網走交通採石プラント	東藻琴末広628番1

令和7年3月19日 第1回中間処理施設建設候補地評価委員会
委員長選任、候補地評価の方法、決定までの流れ確認（構成）
有識者3名（大学教授）、構成市町の副市町長6名

令和7年4月10日 第2回中間処理施設建設候補地評価委員会
評価の実施方針について（必要な条件設定、絞り込み）

※「不適」の条件

①活断層／②埋蔵文化財（元町遺跡・中央7遺跡）／③鳥獣保護区のうち特別保護地区／④急傾斜崩壊危険区域／⑤津波浸水想定、津波災害警戒区域により、「網走交通砕石プラント（東藻琴末広628番1）」のみ適合

詳細評価地

- ① 網走市字二見ヶ岡67番地 外
- ② 美幌町報徳78番地 外
- ③ 清里町字江南807番地5
- ④ 大空町東藻琴末広628番1


令和7年5月24日 詳細評価地現地踏査
第3回中間処理施設建設候補地評価委員会
評価項目協議（評価項目の決定）

令和7年6月20日 第4回中間処理施設建設候補地評価委員会
詳細評価地の評価・集計、順位付け・付帯意見整理

令和7年6月27日 斜網地区廃棄物広域化推進協議会市長町長会議
建設候補地決定、処理方式決定

2 建設候補地・処理方式

(1) 建設候補地 美幌町報徳78番地 外

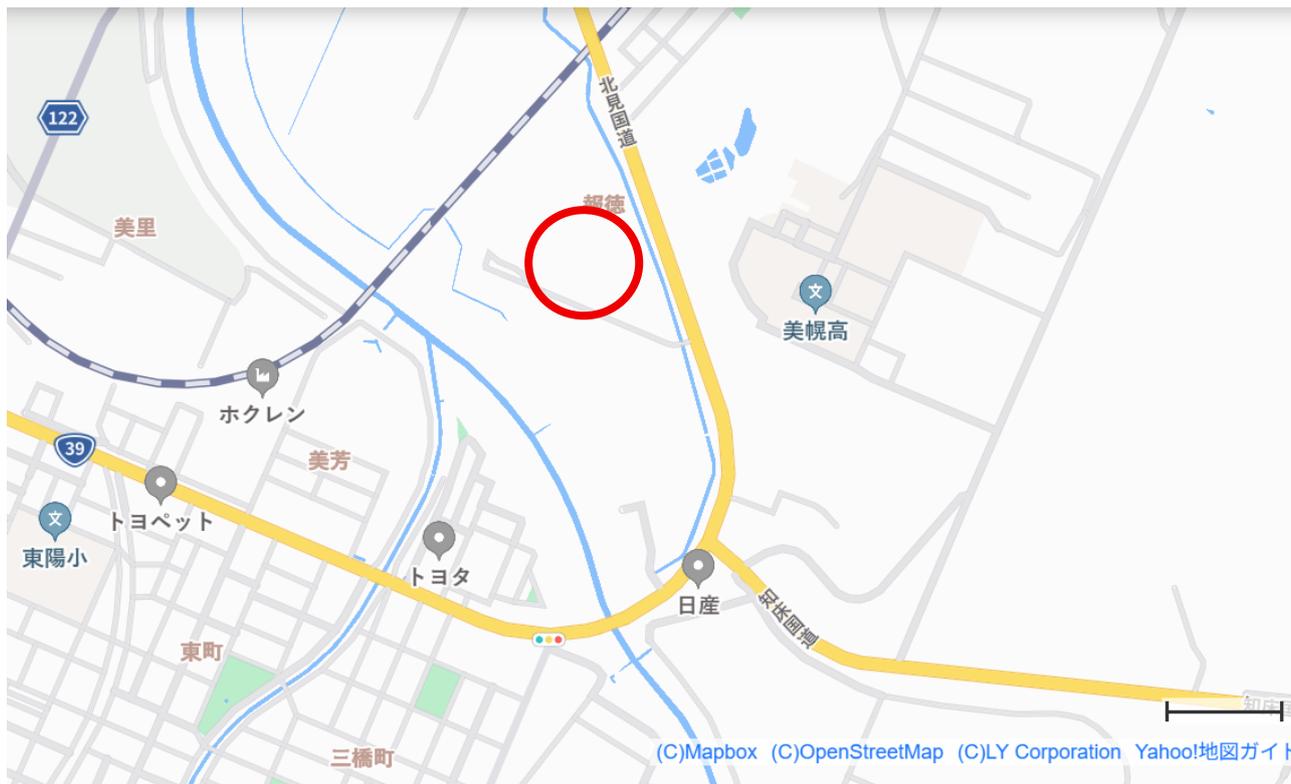

(2) 処理方法

焼却施設を基本とした施設。ただし、現在エネルギーの回収方法として検討している排熱を利用した温水利用のほか、太陽光パネル、小規模蒸気発電（バイナリー発電）等の付帯設備として脱炭素に寄与できる設備も検討を継続する。

※焼却施設に（可燃ごみの機械選別→メタンガス化）施設を併設させたメタンコンバインド方式は、交付金の制度改正・分別精度の懸念等から焼却施設を基本とした施設整備を主流とすることとした。

3 今後のスケジュール

令和7年7月から9月	事前調査
令和7年7月から令和8年4月	住民説明・合意形成
令和8年5月	建設予定地決定
令和8年5月から令和9年4月	環境影響調査（環境アセスメント）
令和9年5月から令和10年7月	施設実施設計
令和10年8月から	施設建設工事・試運転
令和13年10月から令和14年7月	供用開始

4 取り下げ地の対応（概要）

地山の急斜面、廃棄物の埋設が確認されたものの、近年土砂崩れ・廃棄物の飛散は確認されていないことから、次のとおり対応する。（北海道への改善報告概要）

- ① 公共工事等で土砂が必要な場合、形成をしながら搬出
- ② 土砂搬出の際、搬出土をふるい分けし、廃棄物を随時処理
- ③ 令和18年3月までに処理完了予定
- ④ 特別な土砂流出対策工事を行わない。
